

A vertical splash of water with many bubbles and droplets, set against a dark blue background that transitions to a lighter blue gradient on the right side.


# CamelNET

Výstavba MAN pro Plzeňský kraj

Martin Benda

21. 6. 2011


O<sub>2</sub>

- 
1. Základní informace
  2. Schéma sítě
  3. Aktuální stav výstavby
  4. Dotazy
  5. Závěr

## Základní informace

- celkem 33 přípojných míst
- místní šetření doposud provedeno v 31 lokalitách
- ÚR nutné v 18 případech
- minimálně 2 optická vlákna do každé lokality
- správa po dobu 5 let – 24x7x365 (HelpDesk 800111777)
- 1. etapa do 16.10. 2011 (8 uzlových lokalit)
- 2. etapa do 31. 3. 2012 (4 uzlové lokality)

# Schéma sítě

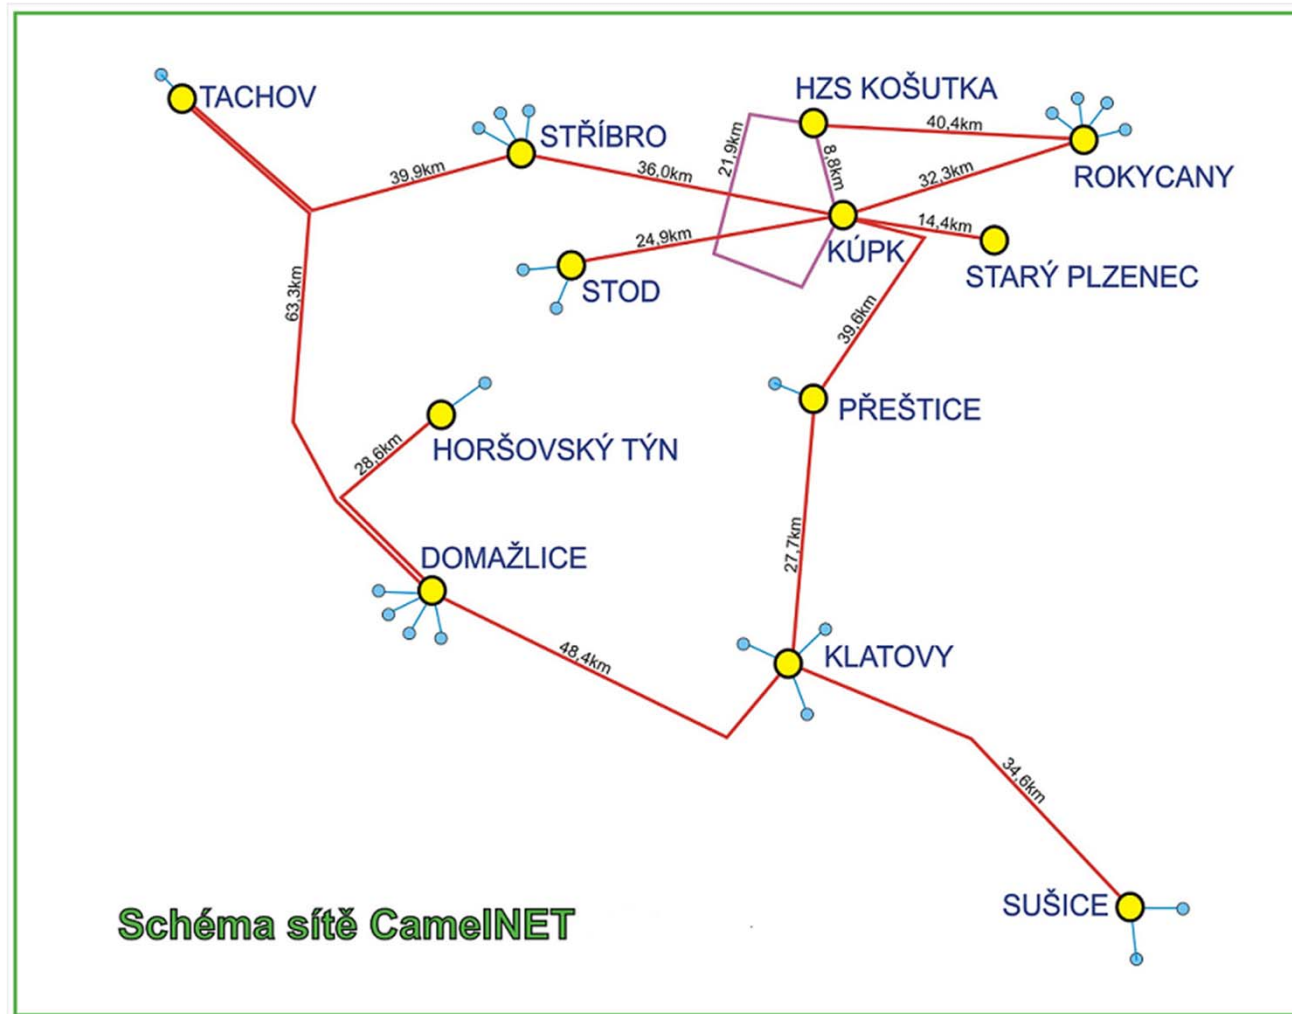

# Aktuální stav výstavby

LOKALITA							
A	B	plánovaný TP O2	plánovaný TP SUPtel	skutečný TP	plánovaný TV	skutečný TV	rack
Křimice	Chotíkov	31.7.2011	27.5.2011	27.5.2011	30.6.2011		
Chotíkov	Lochoťín	30.8.2011	30.8.2011				
PN Bory	TR282	15.7.2011	15.7.2011				
PN Solní	PN Škroupova	20.6.2011	27.5.2011	10.6.2011			
Čiháň	Kolínec	30.6.2011	27.5.2011	27.5.2011	30.6.2011		
Klatovy	MÚ	15.6.2011	10.6.2011	16.6.2011			nový
Klatovy	ZSS	15.8.2011	Nutné ÚR				
Klatovy	SÚS	20.8.2011	22.6.2011				
Klatovy	ISŠ	15.8.2011	Nutné ÚR				
Rokycany	MÚ	30.7.2011	Nutné ÚR				nový
Rokycany	ZSS	20.8.2011	Nutné ÚR				
Rokycany	SÚS	20.8.2011	Nutné ÚR				
Rokycany MÚ	HZS	20.8.2011	30.7.2011				
Rokycany MÚ	nemocnice	20.8.2011	Nutné ÚR				
Lochoťín	HZS	21.8.2011	Nutné ÚR				
Domažlice	nemocnice	15.8.2011	Nutné ÚR				stávající
Domažlice	MÚ	10.7.2011	10.6.2011				nový
Domažlice	ZSS, SÚS	15.8.2011	Nutné ÚR				
Stříbro	MÚ	15.8.2011	22.6.2011				

# Aktuální stav výstavby

LOKALITA							
A	B	plánovaný TP O2	plánovaný TP SUPTel	skutečný TP	plánovaný TV	skutečný TV	rack
Stříbro	SÚS	15.8.2011	Nutné ÚR				
Stříbro ZSS	HZS	15.8.2011	Nutné ÚR				nový
Stod	MÚ	15.7.2011	Nutné ÚR				nový
Stod	nemocnice	20.8.2011	30.7.2011				stávající
Stod	SÚS	30.10.2011	30.7.2011				rack/ODF
Starý Plzenec	SÚS	20.8.2011	Nutné ÚR				nový
Tachov	MÚ	16.7.2011	16.7.2011				nový
Tachov	ZSS, SÚS	20.8.2011	Nutné ÚR				
Sušice	MÚ	16.7.2011	10.6.2011				nový
Sušice	ZSS	30.10.2011	Nutné ÚR				
Sušice	HZS	30.10.2011	Nutné ÚR				
Přeštice	MÚ	15.8.2011	Nutné ÚR				nový
Přeštice MÚ	HZS	15.9.2011	<b>oprava 2m</b>				stávající
Horšovský Týn	MÚ	20.8.2011	Nutné ÚR				nový
Horšovský Týn	SÚS	30.9.2011	20.8.2011				stávající

<b>plánovaný TP O2</b>	předpokládáný termín předání PD a dokončení přípravy O2
<b>plánovaný TP SUPTel</b>	upřesněný plánovaný termín předání PD od SUPTel
<b>skutečný TP</b>	skutečný termín předání PD a dokončení přípravy
<b>plánovaný TV</b>	předpokládáný termín předání OK do provozu
<b>skutečný TV</b>	skutečný termín předání OK do provozu
<b>rack</b>	info, zda bude instalován nový rack, nový=zajišťuje Kraj
<b>Hlavní kruh</b>	Termín připojení lokality do 16.10. 2011

# Dotazy

A dynamic splash of water with numerous bubbles and droplets against a dark blue background, occupying the left side of the slide.

**Děkuji Vám za pozornost**

Martin Benda

[martin.benda@o2.com](mailto:martin.benda@o2.com)
